


LOGÍSTICA DE ARMADO

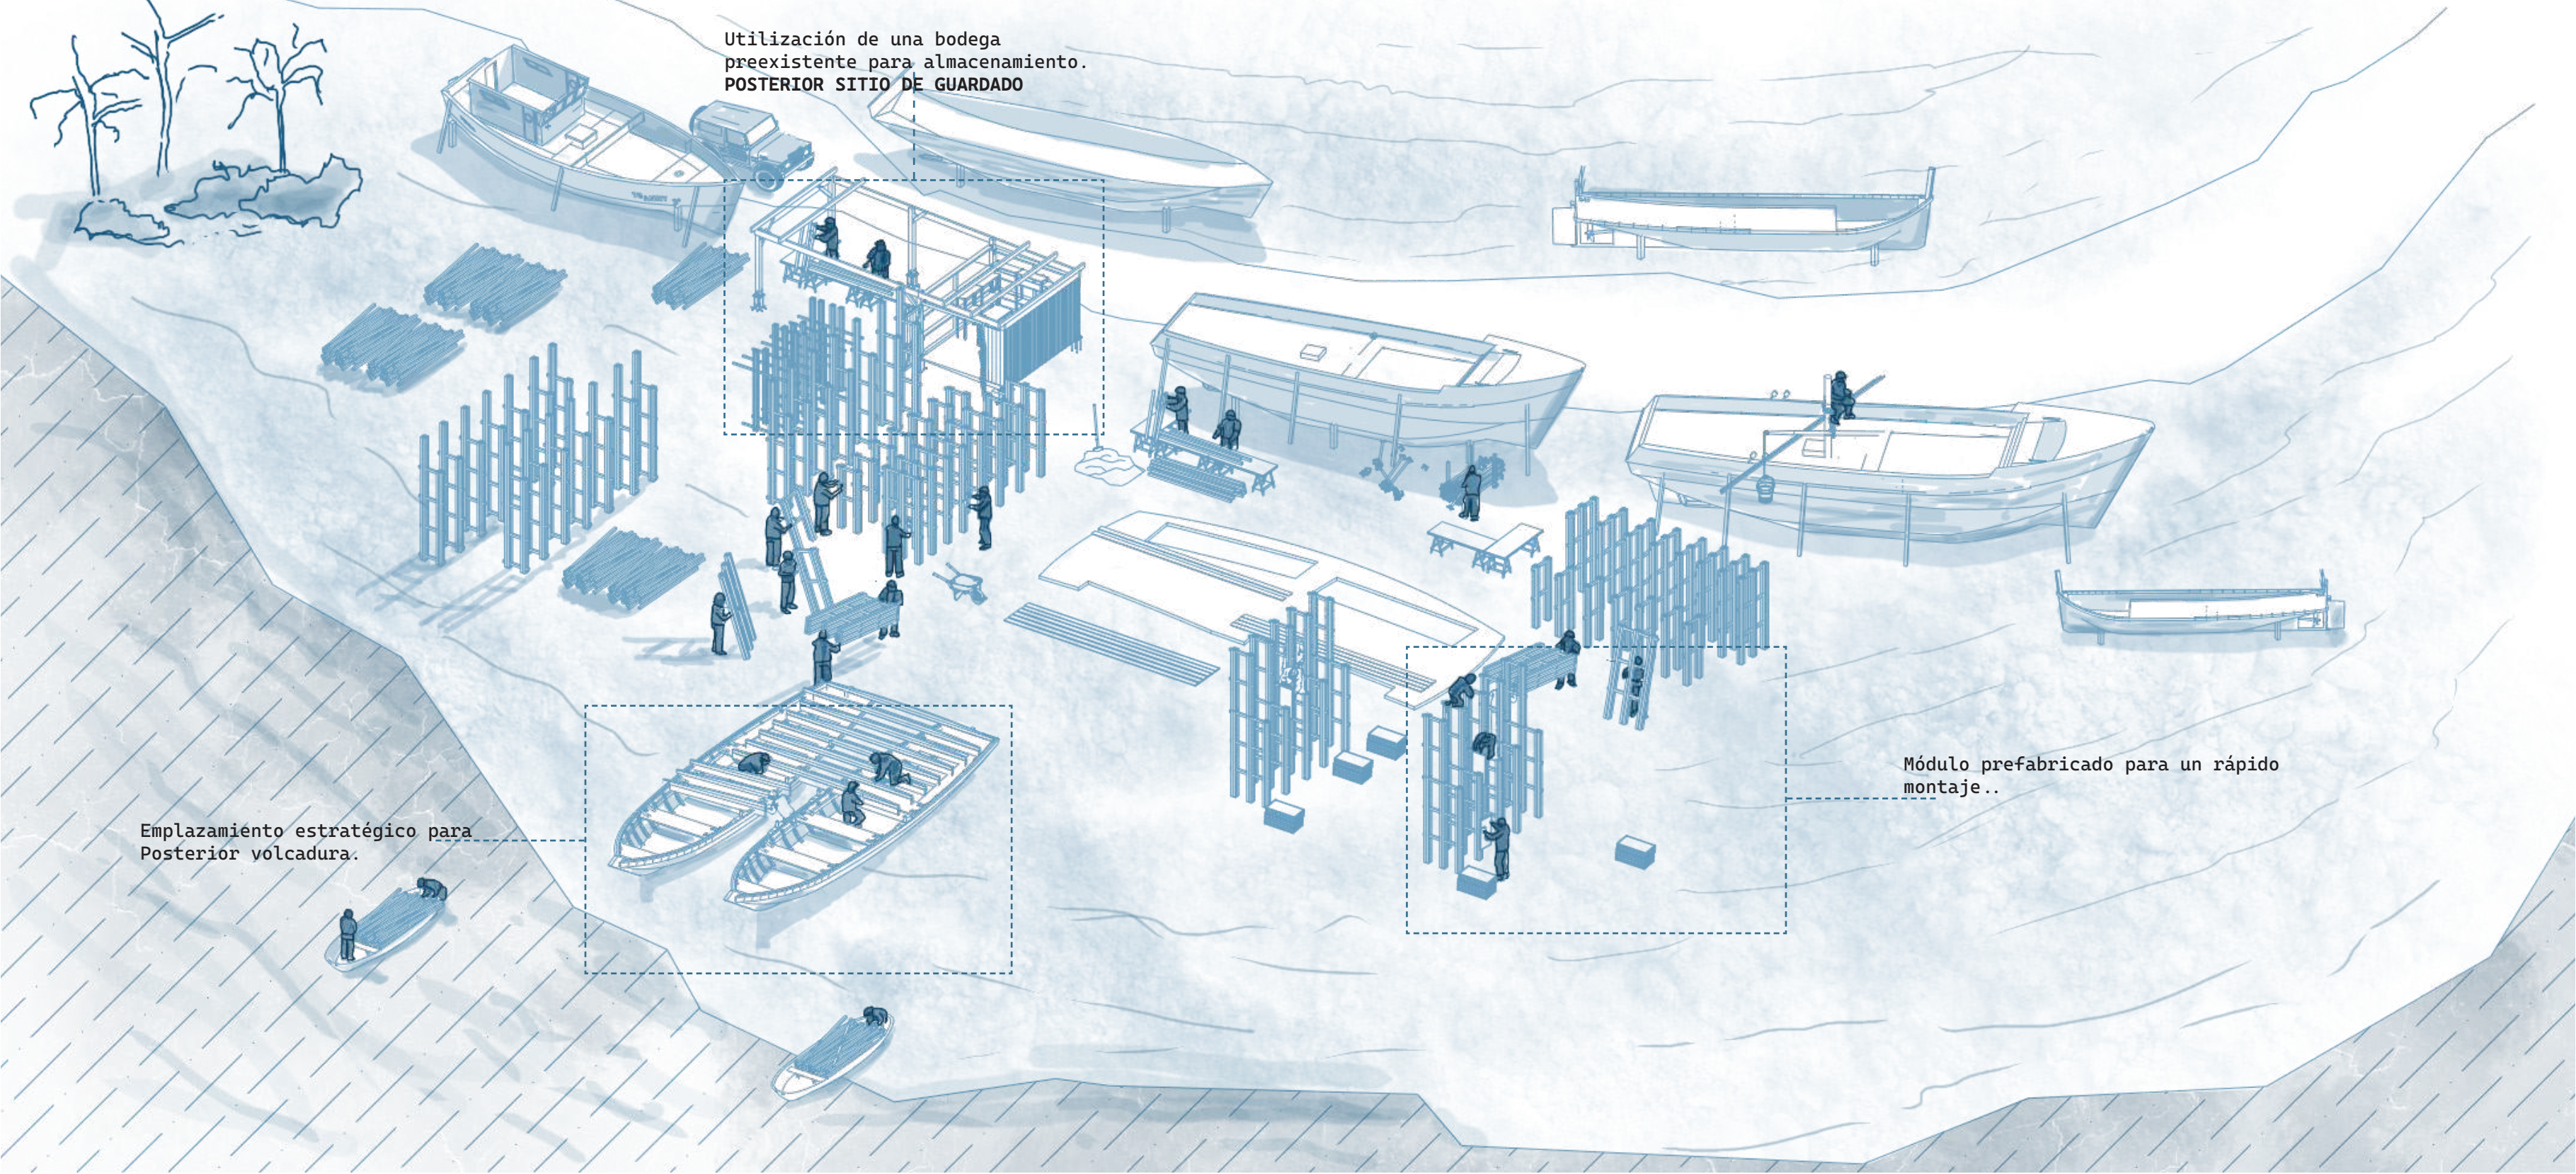

MODULO CONSTRUCTIVO PREFABRICADO

Marco estructural completo

Marcos prefabricado

M4 M5 M3 M6 M2 M1

Para acotar el tiempo de armado a 16 hrs repartido en 2 días previo a la ceremonia se opta por la prefabricación de los marcos estructurales y los bastidores para su posterior ensamble en el sitio.

Los módulos estructurales se pensaron para el posterior armado manual y ser transportado por una persona, para la construcción del artefacto se cuenta con un mínimo 8-12 personas.

CATALOGO DE PIEZAS

Pieza de 50x50 MM

3m (80un) 4,6m (20un)
5m (80un) 4 m (8un)
7m (80 un) 5,6m (48un)
4,2 m(56 un)
5,2 m(10 un)

Machimbrado 114x19 mm

180 unidades

Pieza de 65x65 MM

Pieza 5,2m (78un)
Pieza 6m (30un)
Pieza 4,6 (5 un)
Pieza 3,4m (7 un)
Pieza 1,1m (30un)
Pieza 1,4m (154un)
Pieza 2,2m (22un)
Pieza 3m (120un)
Pieza 5m (120un)
Piezas 7m (120un)
Piezas 4,2m(28 un)

Pieza de 65x200 MM

30 unidades

Pieza curva de 65x200 MM

30 unidades

1 Sistema de anclaje a los botes junto a las vigas compuestas.

2 Montaje del machimbrado de la plataforma.

3 Anclaje de los marcos a las cuadernas de las preexistencias.

4 Piezas transversales se emplean como tarugos para arriostrar los marcos.

5 Montaje de los marcos de los demás niveles superiores.

6 Armado de los elementos verticales de menor escuadria (5x5 mm).

7 Culmine de la construcción, se comparte comida como es tradición de las mingas.

8 Volcamiento manual al mar, espera al siguiente día para la procesión.
