



1

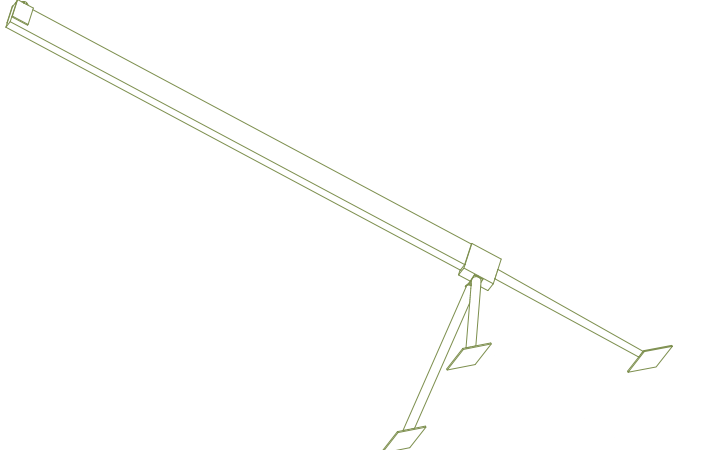


Instalación de pletinas y puntales.

2

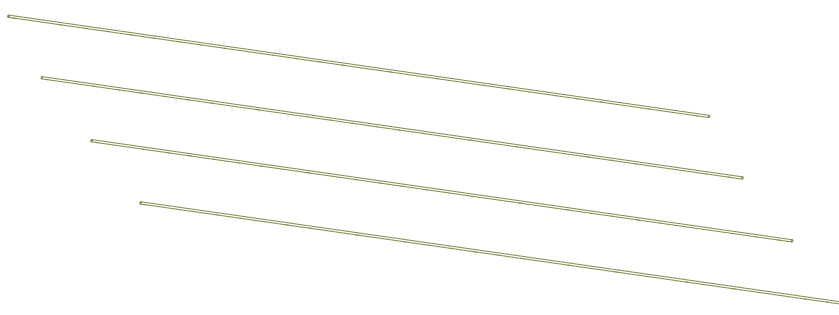


Instalación de tensores.

3

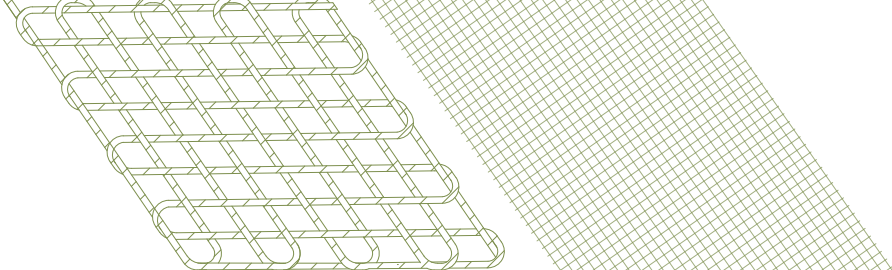


Instalación de cuerda y malla.

4

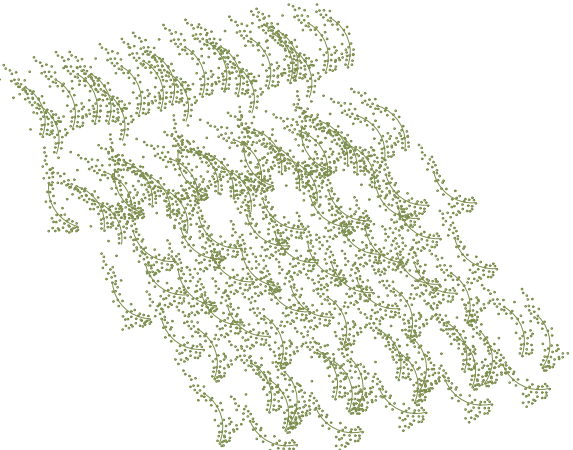


Instalación de totora.

5

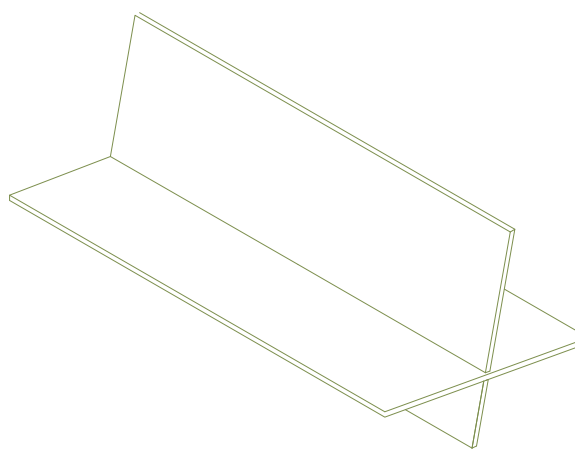

Instalación de mobiliario.

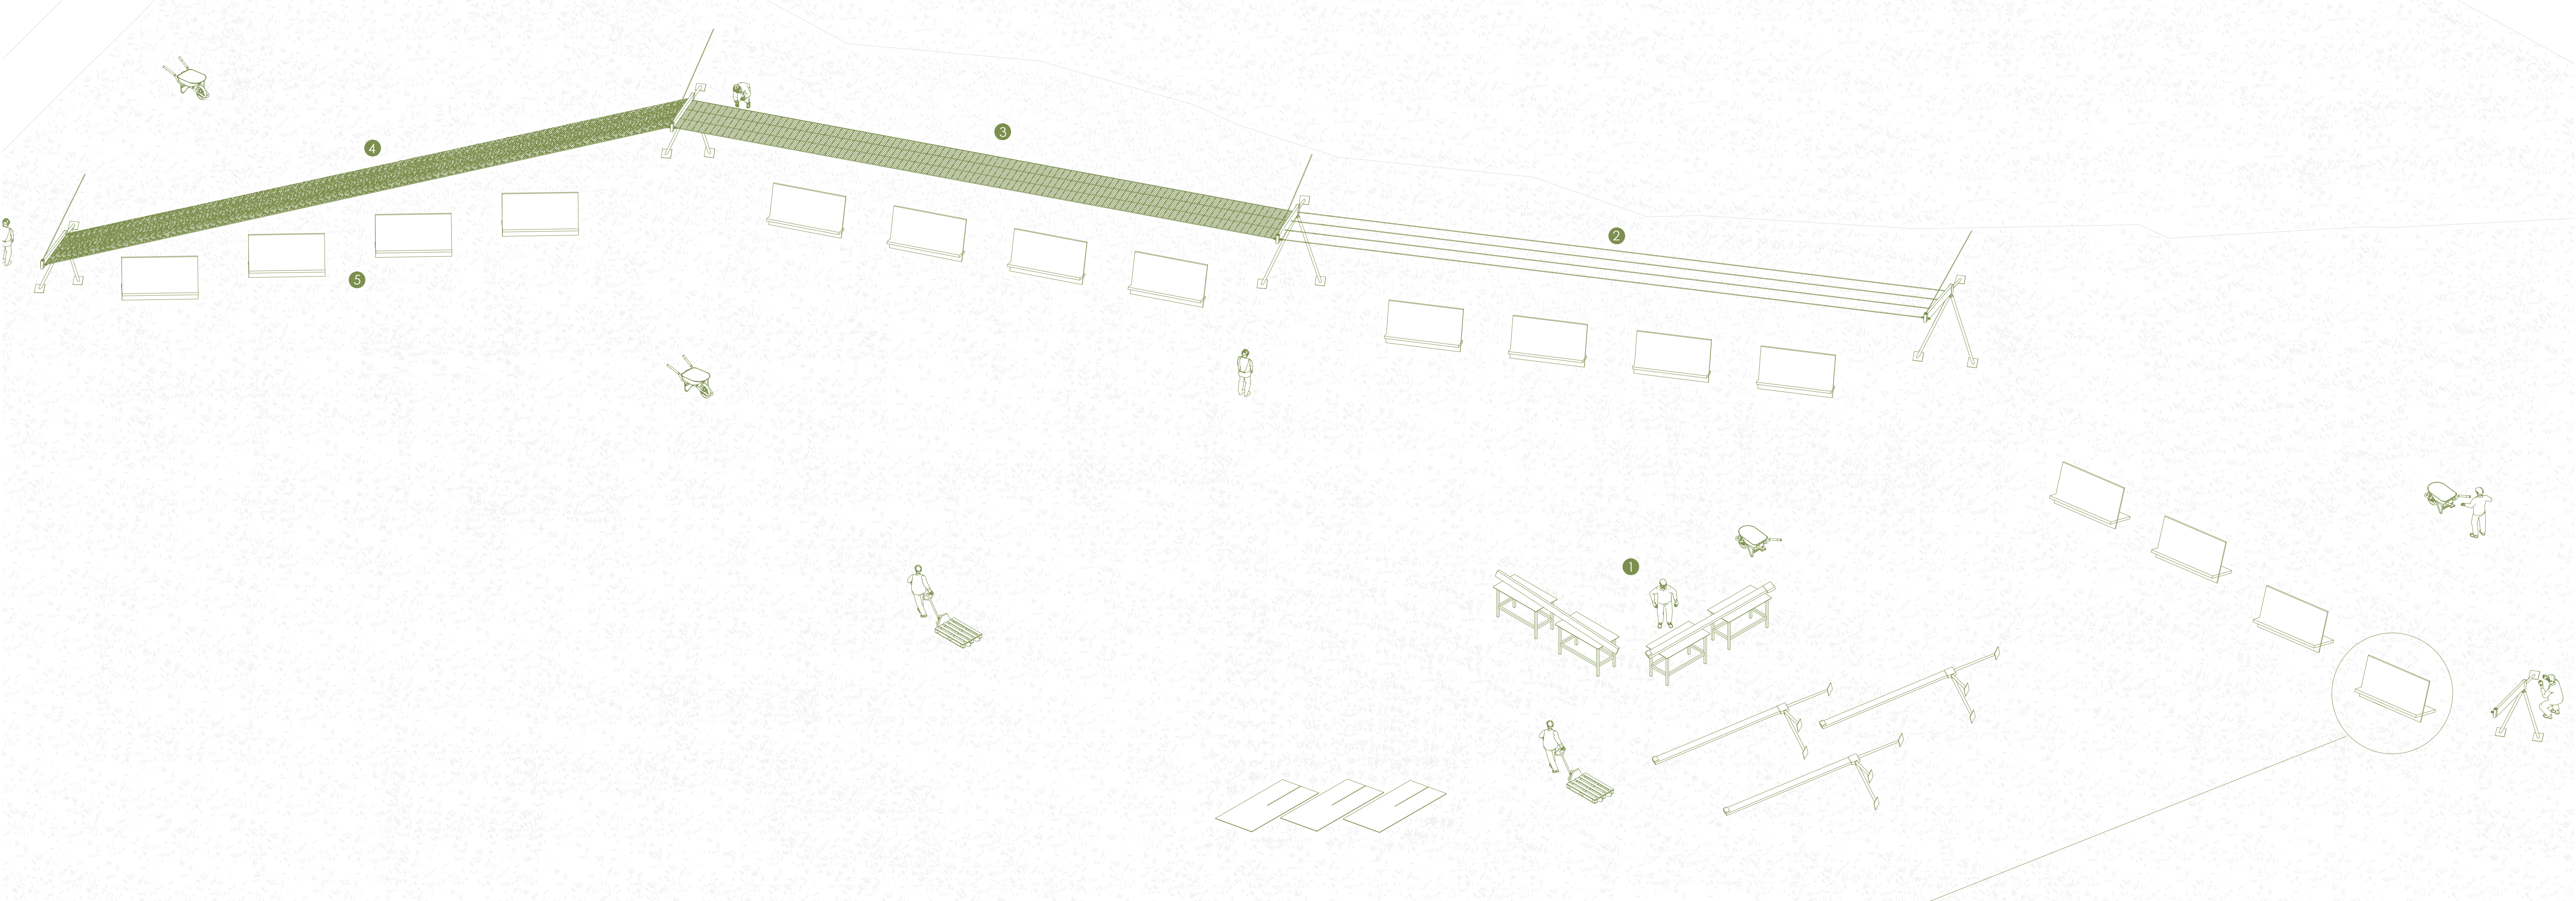

Sistema constructivo mobiliario

Actividad	Días	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
A.- Prefabricación vigas.	21					
B.- Prefabricación pletinas y puntales.	7					
C.- Prefabricación mobiliario.	7					
D.- Recolección de la totora.	1					
E.- Secado de la totora.	15					
F.- Agrupamiento de rocas.	1					
G.-Transporte de piezas prefabricadas.	7					
H.- Unión de vigas con pletinas.	1					
I.- Unión de vigas con puntales.	1					
J.- Instalación de tensores de acero en las vigas.	1					
K.- Entrelazado de cuerda.	1					
L.- Instalación de malla sobre tensores y cuerdas.	1					
M.- Instalación de la totora en techumbre.	1					
N.- Ensamble y montaje de mobiliario.	1					

